



Новый кампус Ardingly Astana

Ход строительства и
ключевые этапы реализации
28 сентября 2026 года






График СМР



№	Наименование	Дата завершения	июнь.26	июль.26	авг.26	выполнено в%
1	Подготовительные работы					100%
2	Работы нулевого цикла					100%
3	Монолитные работы					100%
4	Стены и перегородки					100%
5	Кровля, КМ					100%
6	Оконные блоки					100%
7	Внутриплощадочные сети					100%
8	Инженерные системы					95%
9	Внутренняя отделка					95%
10	Фасадные работы					100%
11	Благоустройство					75%
12	Материальное оснащение					100%
13	Введение в эксплуатацию					0%
14	Организация учебного процесса					100%





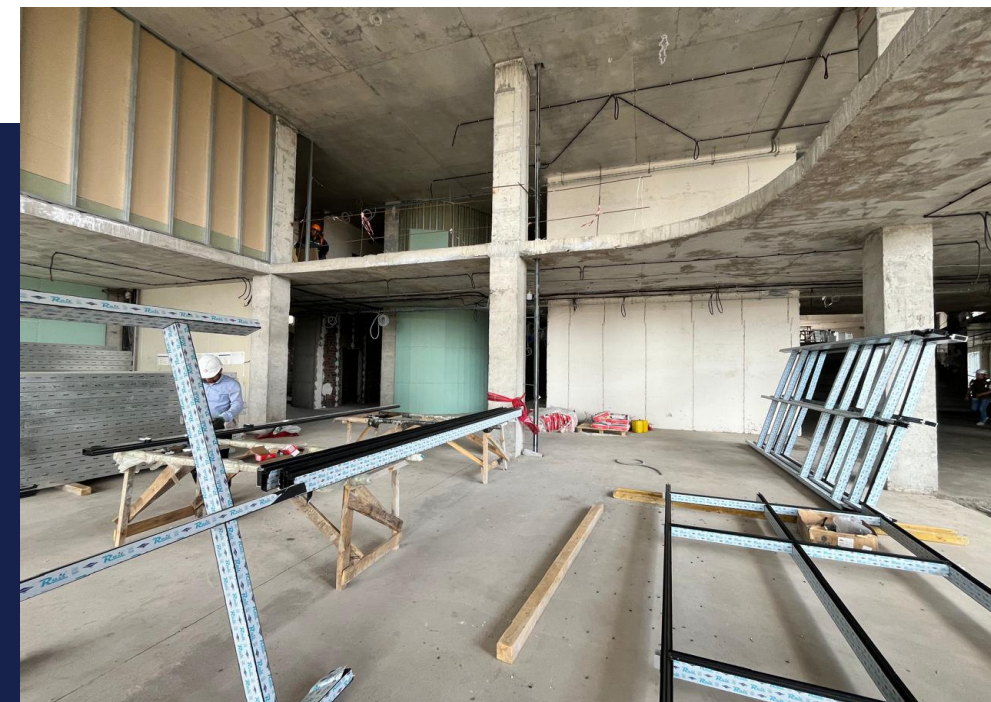




25 сентября 2026



10 июня 2026

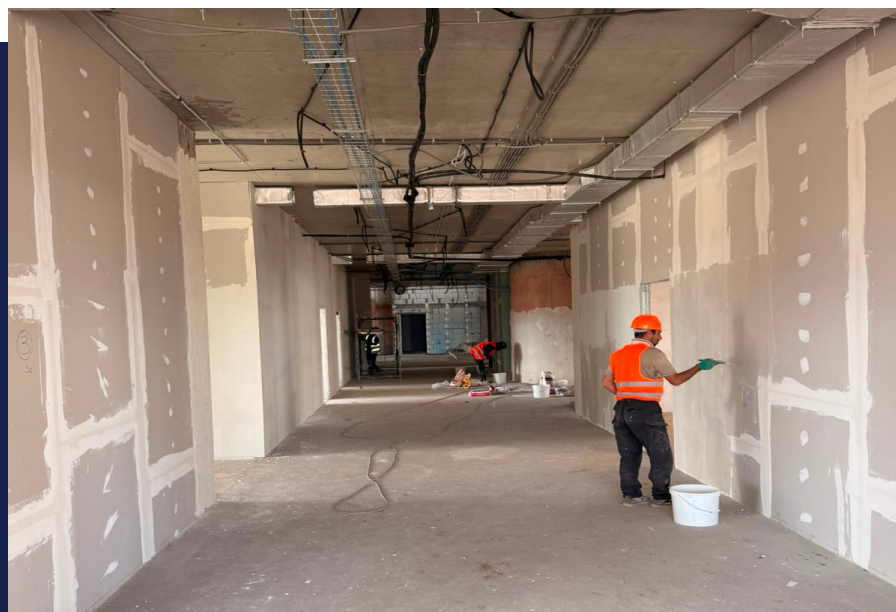



25 сентября 2026



10 июня 2026





10 июня 2026




25 сентября 2026





25 сент

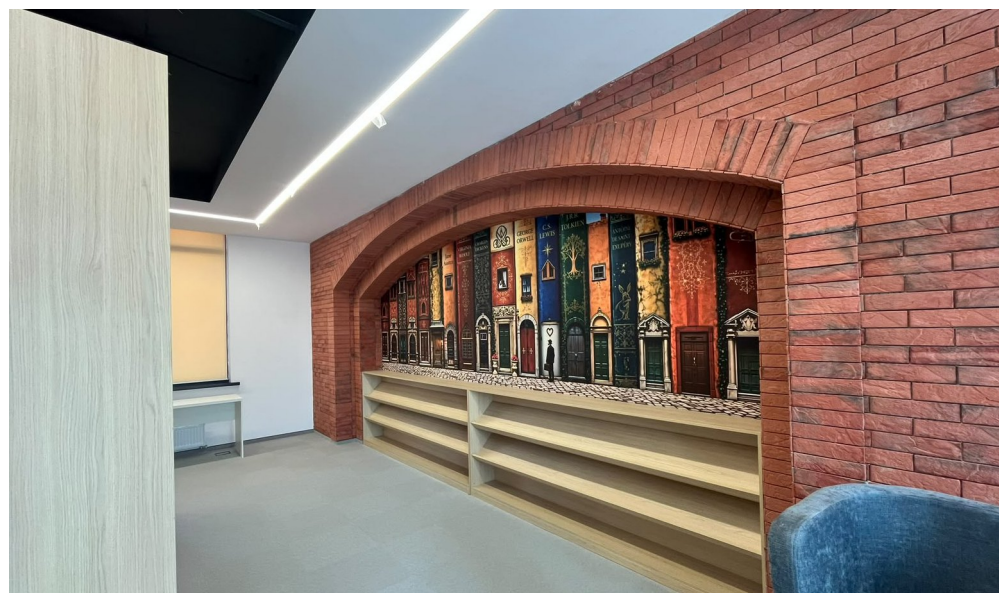



25 сентября 2026





Спасибо за внимание!
